

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 三期 42000 立方米油品仓储项目  
项目编号 2202-640323-07-01-764974  
建设地点 盐池县花马池镇境内  
验收单位 宁夏江鑫石油化工有限公司

2024 年 7 月 4 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	三期 42000 立方米油品仓储项目	行业类别	油气储存与加工工程
主管部门 (或主要投资方)	宁夏江鑫石油化工有限公司	项目性质	新建项目
水土保持方案批复机关、 文号及时间	盐池县审批服务管理局 盐审许可 2024-012 号、2024 年 5 月 29 日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2023 年 3 月至 2023 年 11 月		
水土保持方案编制单位	宁夏睿创节能环保科技有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	江苏佑峰建设工程有限公司		
主体工程监理单位	\		
水土保持设施验收技术 服务单位	\		

## 二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）等规定，2024年7月4日，宁夏江鑫石油化工有限公司组织召开了三期42000立方米油品仓储项目水土保持设施自主验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位宁夏睿创节能环保科技有限公司、水土保持施工单位江苏佑峰建设工程有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了宁夏江鑫石油化工有限公司关于项目水土保持设施自验情况的汇报，经质询和讨论，形成以下意见：

### （一）项目概况

三期42000立方米油品仓储项目位于盐池县花马池镇，厂区中心地理坐标：东经107°27'19"，北纬37°44'55"。建设规模为建设17台常压储罐及配套设施设备，建设内容为新建11台3000m<sup>3</sup>常压储罐、3台2000m<sup>3</sup>常压储罐、3台1000m<sup>3</sup>常压储罐以及厕所、迁建危废暂存间等配套设施设备。

项目实际总占地2.93hm<sup>2</sup>，全部为永久占地，占地类型为工业用地。项目实际土石方挖方2.21万m<sup>3</sup>，填方2.21万m<sup>3</sup>，挖填平衡。工程实际总投资070.45万元，土建投资1567.45万元，项目于2023年3月开工，2023年11月完工，总工期9个月。

### （二）水土保持方案批复情况

2024年5月29日，盐池县审批服务管理局以盐审许可2024-012

号文对本项目水土保持方案予以批复。批复水土流失防治责任范围为 2.93hm<sup>2</sup>，批复水土保持总投资 30.86 万元，其中水土保持补偿费 2.93 万元。批复水土流失防治标准等级执行北方风沙区一级标准，水土流失防治指标值为：水土流失治理度 85%，土壤流失控制比 0.80，渣土防护率 87%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不作要求。

### （三）水土保持后续设计情况

本项目水土保持方案为补报，现状已实施的各项水土保持措施得当，落实到位，本方案未新增水土保持措施，不再进行专项的水土保持后续设计。

### （四）验收准备情况和主要结论

2024 年 7 月 4 日，宁夏江鑫石油化工有限公司组织相关人员对该项目通过现场核查、收集并查阅设计、施工有关资料，进行了自主验收准备工作。查阅主体工程施工资料，本项目实际实施的水土保持工程措施有：碎石覆盖 1.01hm<sup>2</sup>；临时措施有：洒水抑尘 900m<sup>3</sup>，防尘网苫盖 0.35hm<sup>2</sup>，彩钢板拦挡 925m。实际完成水土保持投资 30.86 万元。

各项措施实施后水土流失防治指标值为：水土流失治理度 99.99%，土壤流失控制比 5.0，渣土防护率 92%。均达到了方案设计的指标值。

水土保持设施验收主要结论：建设单位依法依规编制了水土保持方案，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持后续管理、维护责



任落实；工程水土保持设施具备验收合格的条件，可以开展水土保持设施验收工作。

### **（五）验收结论**

验收组认为：三期 42000 立方米油品仓储项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标基本达到了批复的水土保持方案确定的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费，运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施验收合格的条件。经验收组评议，同意水土保持设施验收结论为合格。

### **（六）后续管护要求**

项目水土保持设施验收合格后，运管单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓 名	工作单位	职务/职称	签 字	备注
组长	朱朝钢	宁夏江鑫石油化工有限公司	项目 负责人	朱朝钢	建设单位
成 员	王国锋	宁夏睿创节能环保 科技有限公司	工程师	王国锋	水土保持 方案编制 单位
	陈鹤双	宁夏睿创节能环保 科技有限公司	工程师	陈鹤双	
	王明忠	江苏佑峰建设工程 有限公司	项目 负责人	王明忠	水土保持 施工单位
	李 平	宁夏江鑫石油化工 有限公司	生产主任	李平	运行管护 单位
	闫立宏	特邀专家	高 工	闫立宏	

**附件:**

- 1、备案证
- 2、水土保持行政许可承诺书
- 3、水土保持补偿费缴费凭证
- 4、项目现场照片

**附图:**

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目水土保持设施验收图

附图 3 项目建设前后卫星影像对比图



# 宁夏回族自治区企业投资项目备案证

项目代码：2202-640323-07-01-764974

项目名称：三期42000立方米油品仓储项目

项目法人全称：宁夏江鑫石油化工有限公司

社会统一信用代码：91640323MA75W0EN63

企业经济类型：私营企业

建设地点：吴忠市盐池县花马池镇

建设性质：扩建

计划开工时间：2022年02月

项目总投资：3076.45万元

建设规模：本项目占地面积29270平方米，建设17台常压储罐及配套设施设备。

建设内容：本项目建设11台3000m<sup>3</sup>常压储罐，3台2000m<sup>3</sup>常压储罐，3台1000m<sup>3</sup>常压储罐，厕所，迁建危废暂存间等配套设施设备。

项目单位声明：本项目符合国家产业政策、投资政策的规定，符合行业准入标准，且不在《政府核准的投资项目目录》范围之内，并承诺上述备案信息真实合法有效。



此复印件仅供于我司申报办理  
水土保持使用，再次复印无效。  
2024年3月27日






# 水土保持行政许可承诺书

编号: 盐审许字[2024-012号]

项目名称	三期 42000 立方米油品仓储项目
建设地点	盐池县花马池镇，厂区中心地理坐标：东经 107°27'19"，北纬 37°44'55"。
区域	开发区名称：无
评估情况	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无
水土保持方案	公示网站： <a href="http://yanshou100.com/home.html">http://yanshou100.com/home.html</a>
公开情况	起止时间：2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 15 日
	公众意见接收和处理情况：无
生产建设单位	名称：宁夏江鑫石油化工有限公司
	统一社会信用代码：91640323MA75W0EN63
	地址：盐池县工业园区功能区二期
	电子信箱：79344494@qq.com
	法人代表：魏建文
	授权经办人姓名：李平      联系电话：18395239557
	证件类型及号码：身份证      640323198310100215



<p>生产建设单位承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确，所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费 2.93 万元。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.其他需承诺的事项：已按照专家评审意见修改完善水土保持方案。</p> <p>法人代表（签字）：  </p> <p>生产建设单位（盖章）：    2024年5月28日</p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p>水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）    2024年5月28日</p>

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或其他审批部门）、监督检查部门各执1份。



# 中华人民共和国 税收完税证明

国家税务总局盐池县税务局

24(0621)90302826  
填发日期 2024-06-21

纳税人名称 宁夏江鑫石油化工有限公司

纳税人识别号 91640323MA75W0EN63

税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
水土保持补偿费收入	水土保持补偿费收入-建设期收入	2024-06-11至2024-06-11	2024-06-21	29300.00
以上情况 特此证明				

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 贰万玖仟叁佰元整

¥ 29300.00

备注: 明细打印

填票人 宁夏电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证





## 项目现场照片



项目总航拍图---镜头向北



储罐围堰周边布设碎石覆盖措施



厂内生产道路




道路两侧布设碎石覆盖措施



围墙内侧碎石覆盖措施



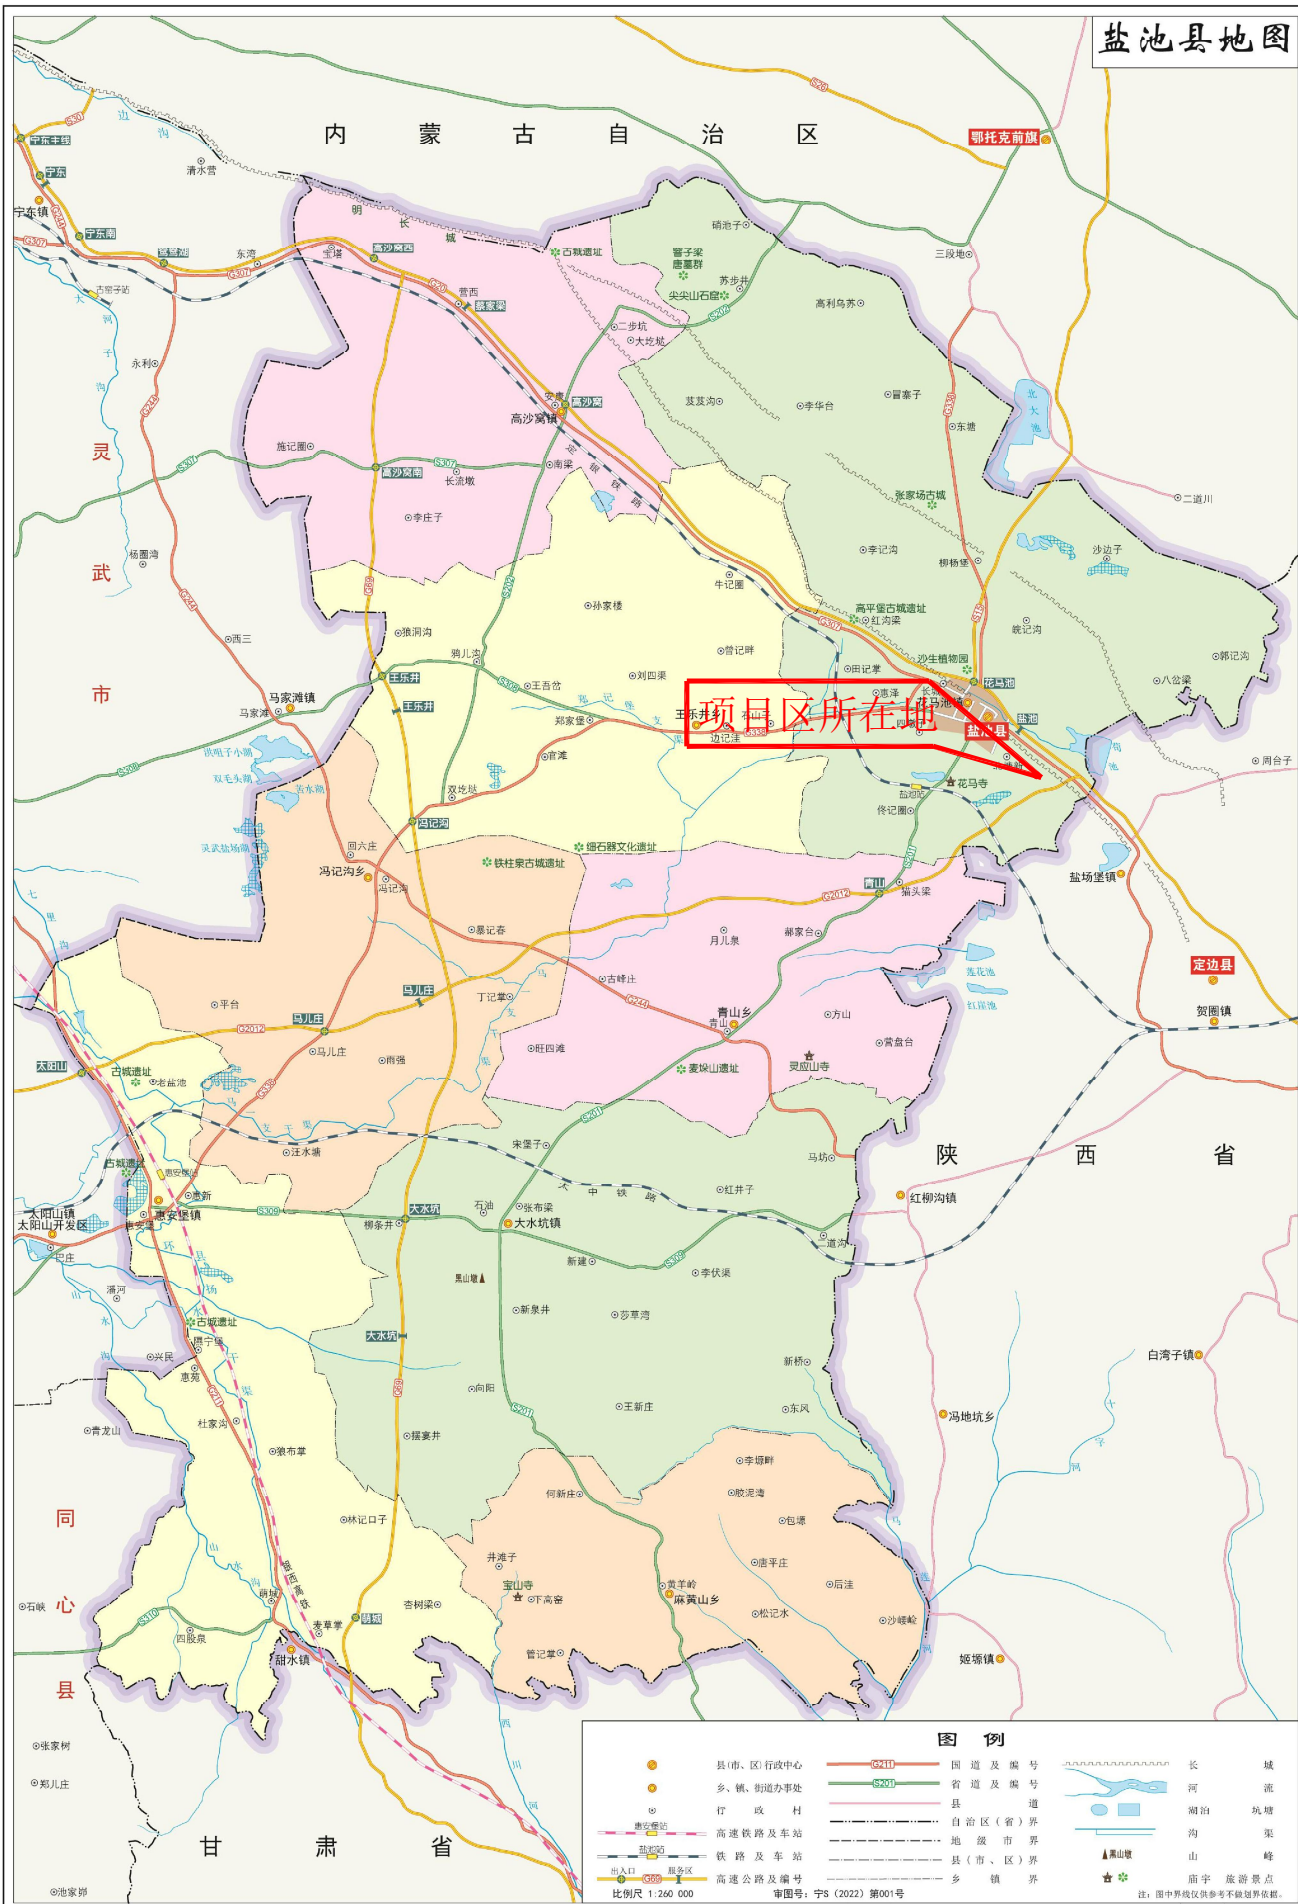

附图1 - 项目区地理位置图




围墙内侧布设碎石覆盖措施，拍摄时间：2024.3月



储罐围堰周边布设碎石覆盖措施，拍摄时间：2024.3月



1:1000

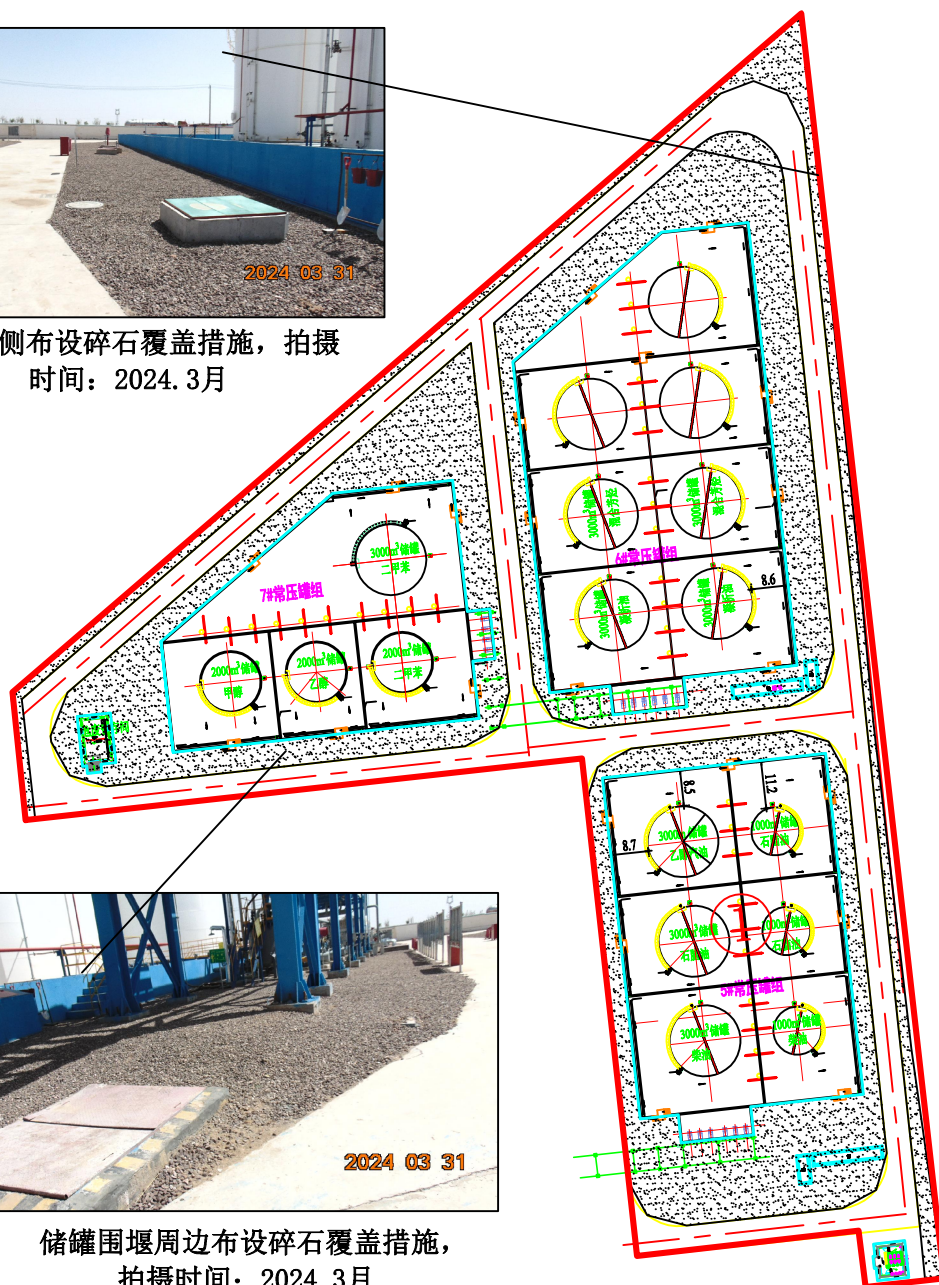

图例：

- 水土流失防治责任范围
- 碎石覆盖
- 新建建筑物
- 道路中心线

水土流失防治责任范围 对比表

单位：hm<sup>2</sup>

水土流失防治 分区	方案设计防治 责任范围 A	实际防治责任 范围 B	增减变化 B-A
主体工程区	2.93	2.93	0.00
合计	2.93	2.93	0.00

水土保持措施实际完成情况与方案设计对比表


水土流失 防治分区	措施类型	措施名称	单位	方案设计防治 责任范围 A	实际防治责任 范围 B	增减变化 B-A
主体工程 区	工程措施	碎石覆盖	hm <sup>2</sup>	1.01	1.01	0.00
		防尘网遮盖	hm <sup>2</sup>	0.35	0.35	0.00
	临时措施	洒水抑尘	m <sup>3</sup>	900	900	0.00
		彩钢板围挡	m	925	925	0.00

水土流失防治 指标完成情况统计表

评估指标	方案目标值（%）	实现值（%）	评估结果
水土流失治理度	85	99.99	达到目标
土壤流失控制比	0.80	5.0	达到目标
渣土防护率	87	92	达到目标

附图2-水土保持设施验收图



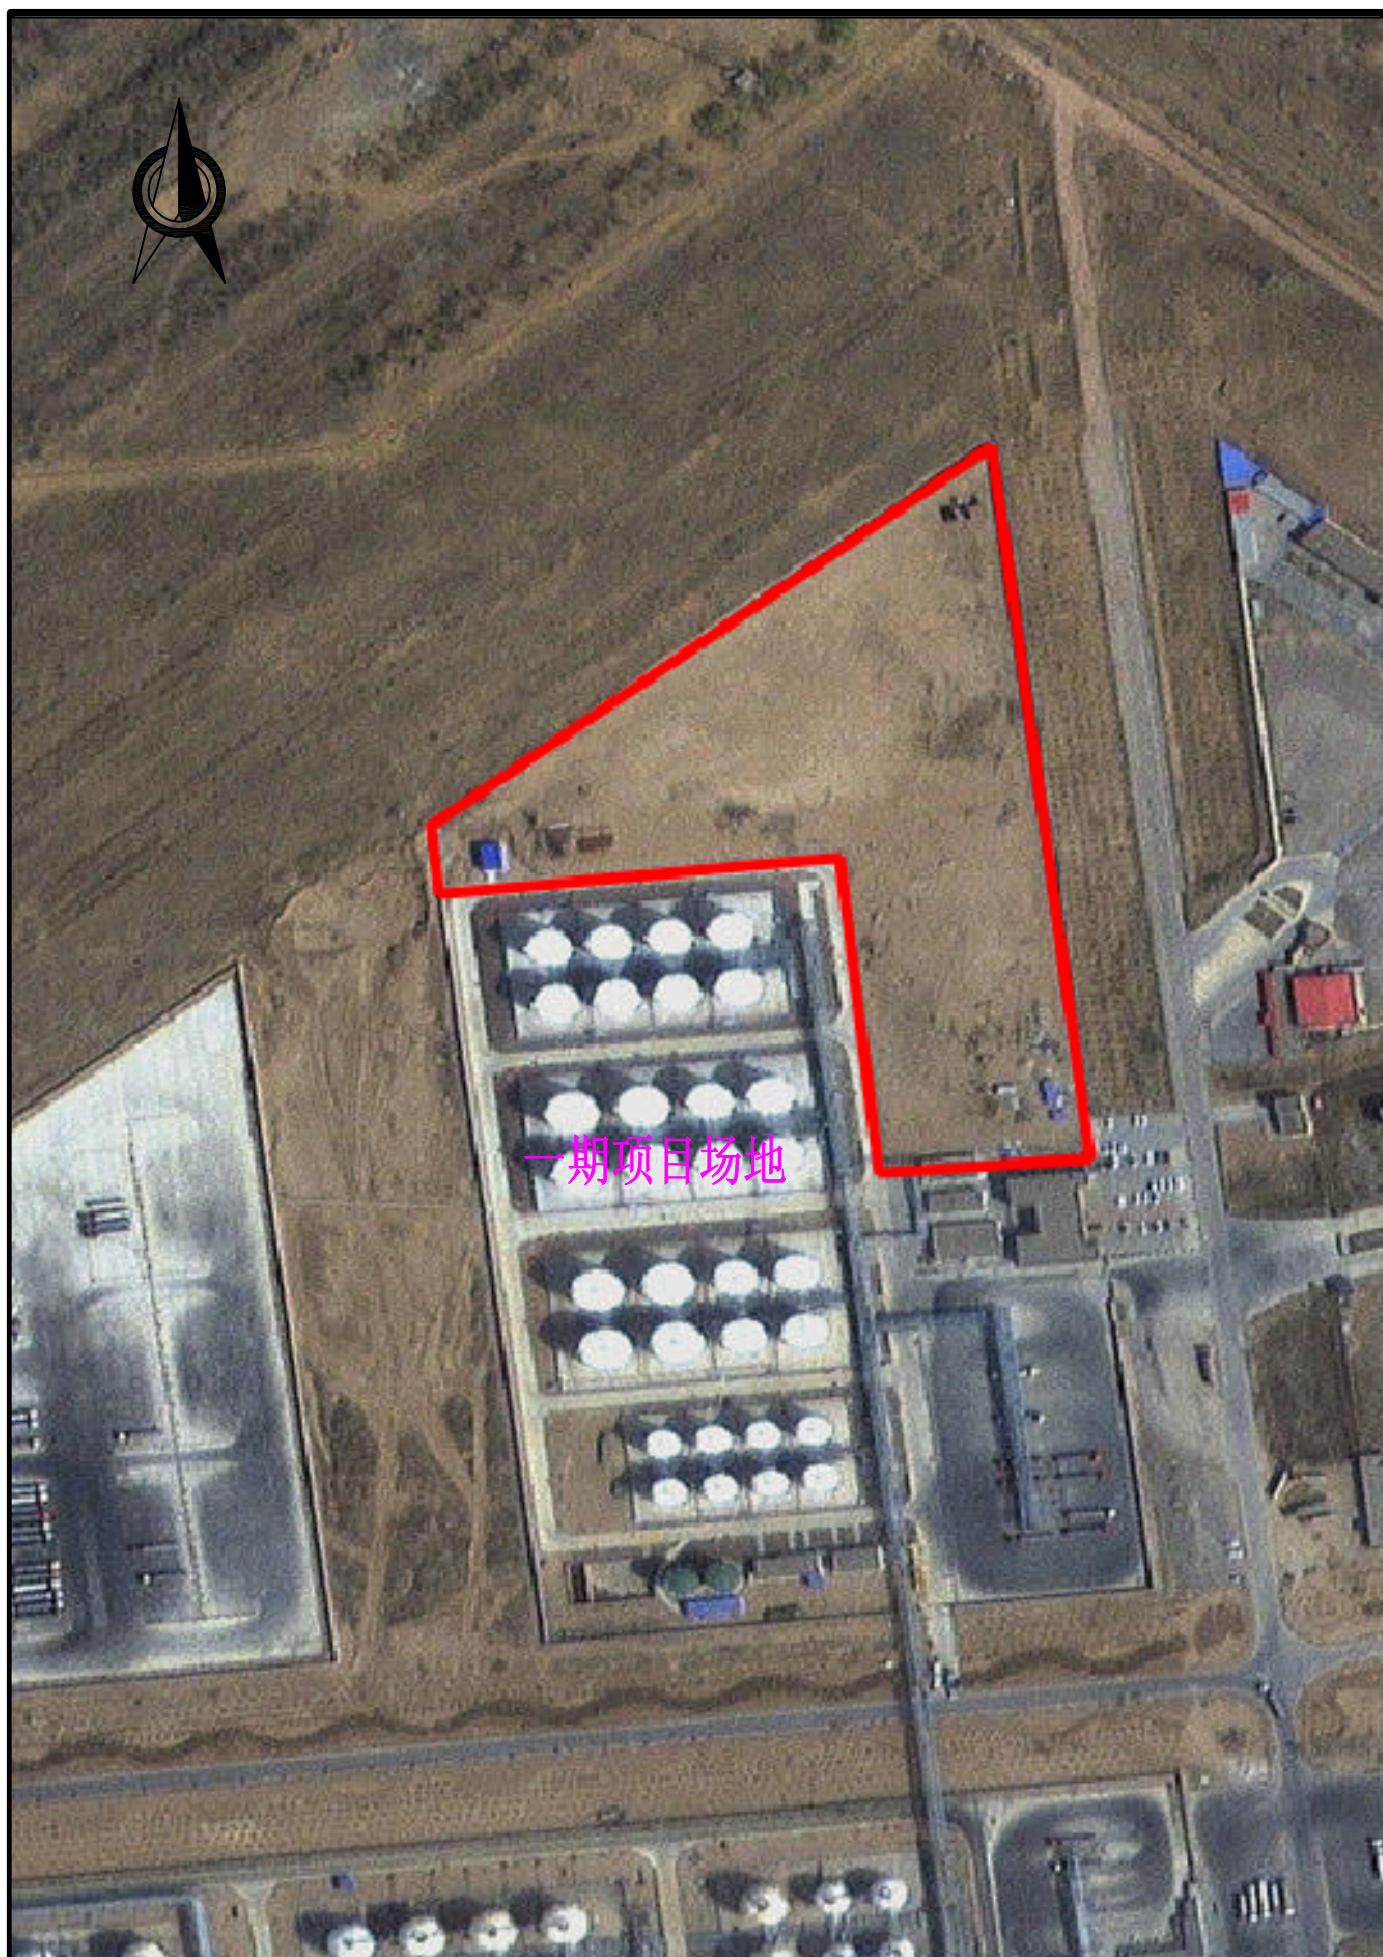

一期项目场地

—— 水土流失防治责任范围

项目建设前卫星影像图



—— 水土流失防治责任范围

项目建设后卫星影像图
