

盐池县草原实验站

盐池县草原实验站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》 建设项目 2021 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我站开展了安全生产技术咨询服务项目 2021 年度绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标下达情况

2021 年县财政局下达我站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》建设项目资金，金额为 199.66 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。盐财（预）指标[2021]1 号文件，指标金额 199.66 万元。

2、项目资金执行情况分析。盐池县草原实验站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》建设项目资金 199.66 万元，2021 年底支付资金 147.88 万元，预计项目期限结束支付完毕。

3、项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管

理办法进行账务处理，使项目资金合理使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程建设项目。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。在项目建设期内，完成工程咨询；设计、勘测，场地平整、垫方 15532 平米；建设门房、库房 221.2 平米；完成生态站室外道路硬化 400 米；完成生态站室外采暖工程 100 米；室外给排水工程 120 米。

(2) 质量指标。项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标。项目建设期限 2021 年 8 至 2022 年 6 月。

(4) 成本指标。工程咨询；设计、勘测，场地平整、垫方费、工程建设费等 147.88 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。增强群众草原保护意识、合理保护和利用草原。


(2) 可持续影响指标。对草原生态系统趋于稳定的影响，按照项目要求按期交付，长期使用。

3、满意度指标完成情况分析。

周边群众满意度达到 96%。

附件：部门项目支出绩效自评表



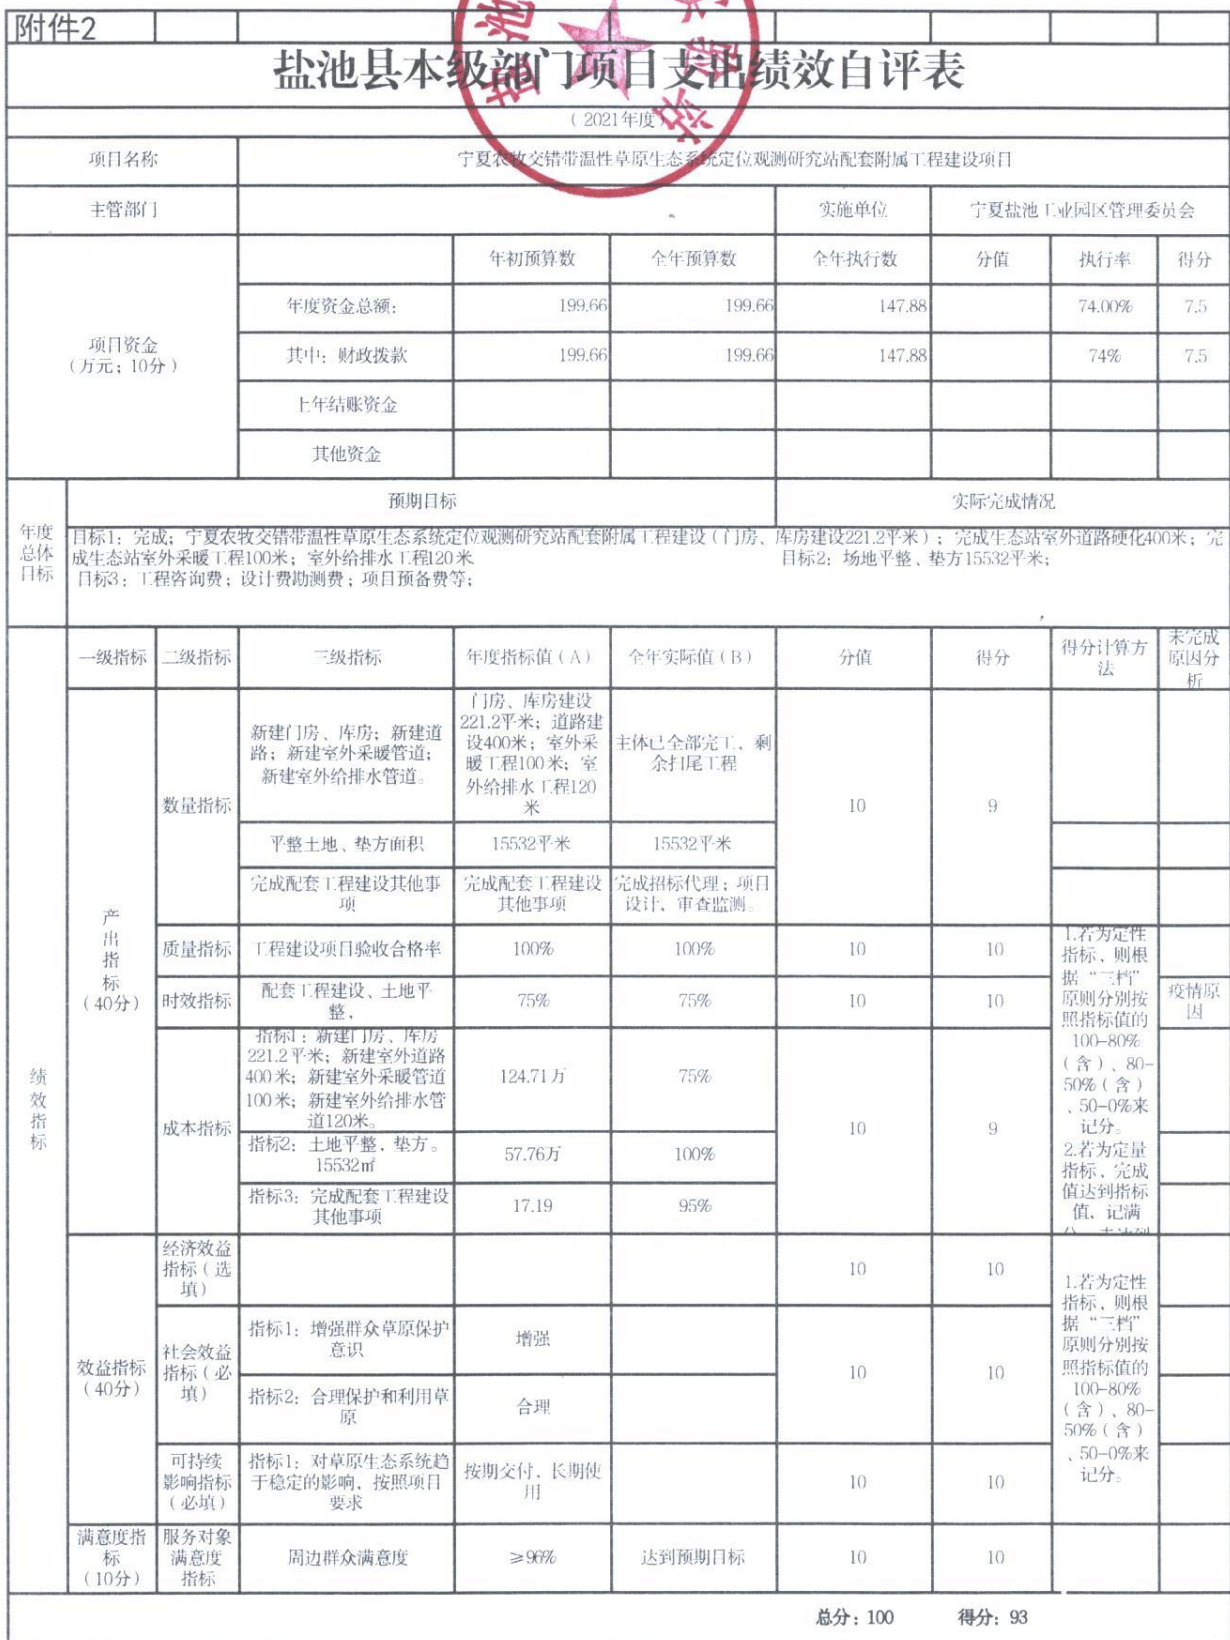

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施
